



## AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS 2015

HERNANDEZ  
INAPUATO, SALAMANCA

APASEO  
EL GRANDE

COMONFORT

JUVENTINO  
ROSAS

CELAYA

VILLAGRAN

APASEO  
EL ALTO

CORTAZAR

JARAL DEL TARIMORO

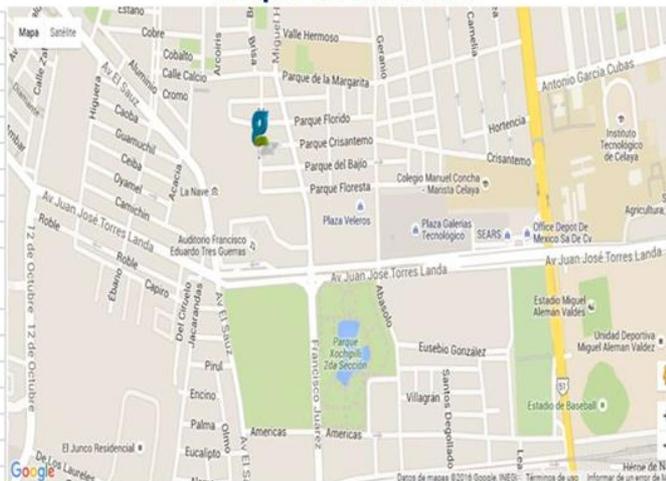
PROGRESO



# ZM

**Datos Generales:**

<b>Tipo de Recurso:</b>	<b>FEDERAL</b>
<b>Inversión Asignada:</b>	<b>\$ 9,677,013.30</b>
<b>Inversión Contratada:</b>	<b>\$ 9,837,775.48</b>
<b>Inversión Ampliación:</b>	<b>\$ 160,762.18</b>
<b>Inversión Total Contratada:</b>	<b>\$ 9,837,775.48</b>
<b>Long. Total de Camino</b>	<b>N/A</b>
<b>Meta Inicial:</b>	<b>3,348.75 M2</b>
<b>Meta Ampliada:</b>	<b>320.00 M2</b>
<b>Meta Total:</b>	<b>3,348.75 M2</b>
<b>Contratista:</b>	<b>ARTURO SERNA GAMIÑO</b>
<b>Fecha Inicio Cto:</b>	<b>02 DE ENERO 2016</b>
<b>Fecha Término Cto:</b>	<b>30 DE SEPTIEMBRE DE 2016</b>
<b>Diferimiento:</b>	<b>NO</b>
<b>Prorroga:</b>	<b>NO</b>
<b>TDPA</b>	<b>N/A</b>
<b>Beneficiarios</b>	<b>362,890 Habitantes</b>
<b>Empleos Directos</b>	
<b>Empleos Indirectos</b>	

**Croquis de ubicación:**

**Período:**

**OCTUBRE 2015 - DICIEMBRE 2016**

**Descripción de Trabajos a Realizar:**

Las obras que se van a realizar con la inversión del fondo en el ejercicio 2015 consisten en la intervención de 4,848.75 m<sup>2</sup> para formar 3,348.75 m. de andadores y 1,500 m<sup>2</sup> de áreas verdes (obra exterior) que ofrecerán la oportunidad de comunicar espacios al interior del parque y permitirán la circulación peatonal propiciando los elementos para la convivencia social, apoyándose mediante el equipamiento fijo que consiste en 27 bancas, 8 botes de basura y 8 juegos infantiles tipo resbaladilla, sube y baja, columpio, etc. y 4 pergolados de herrería que ofrecerán sombra en la zona de bancas, la cual tiene capacidad para 81 personas. Los andadores se iluminan con 16 luminarias, mediante 1,700 m. de instalación eléctrica; se incorporan 1,800 m. de inst. hidrosanitarias y sistema de riego, así como obra exterior, que consiste en 1,500 m<sup>2</sup> de cubre suelos y unidades arbóreas que formarán áreas verdes confortables para el usuario.

**Fotografías:**


<b>AVANCE FISICO</b>	<b>REAL</b>
	<b>89.25%</b>
<b>AVANCE FINANCIERO</b>	<b>REAL</b>
	<b>71.46%</b>

1.00	\$1,076,334.00	\$1,075,257.67	\$914,495.47	\$914,495.47	\$0.00	\$5,795.43	\$5,795.43
------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------	------------	------------

EJECUTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	INVERSION PROPUESTA	ASIGNACION SIN EL 1 AL MILLAR	MONTO DE CONTRATO	MONTO EJERCIDO	SALDO DE CONTRATO A REINTEGRAR	RENDIMIENTO S FINANCIEROS	SUMA DEL REINTEGRO AL FIDEICOMISO	FECHA DE REINTEGRO AL FIDEICOMISO	STATUS DE PROYECTO	ESTATUS ADMVO
SOP	Proyecto ejecutivo para la ciclovia Celaya-Comonfort, Segunda Etapa.	\$1,076,334.00	\$1,075,257.67	\$914,495.47	\$914,495.47	\$0.00	\$5,795.43	\$5,795.43	14/10/2016	TERMINADA	CERRADA FISICA Y ADMVA



APASEO  
EL GRANDE  
COMONFORT

JUVENTINO  
ROSAS  
CELAYA  
VILLAGRAN

CORTAZAR  
JARAL DEL TARIMORO  
PROGRESO



**SEDESHU/gto**

11/11/2016

**ZM**
