



**YURIRIA
MOROLEÓN
URIANGATO**



ZM

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS 2015

Rehabilitación del Camino E.C. Libramiento Sur De Moroleón-Amoles, Tercera Etapa

Municipio(s):

Origen:

Monto contrato:

Descripción General

Rehabilitación de 4.7 kms en un ancho de 6.0 mts de camino cuyos trabajos consisten en la recompactación de la estructura existente, construcción de capa de base hidráulica de 15 cm de espesor, pavimentación con concreto asfáltico de 5 cm y la colocación de señalamiento horizontal y vertical.



Fechas				
Inicio Contrato	Termino Contrato	Recepción de Anticipo	Inicio por Diferimiento	Term. por Prorroga
13/01/2016	26/04/2016	03/02/2016	03/02/2016	10/06/2016

AVANCE FÍSICO ACUMULADO

REAL
100%
PROGRAMADO
100%

Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable, primera etapa

Municipio(s): Moroleón, Uriangato, Yuriria

Monto contrato: \$ 1,355,021.66

AVANCE FÍSICO ACUMULADO

REAL
100%

PROGRAMADO
100%

Descripción General

Contar con una herramienta de planificación que oriente las acciones, las actividades, los indicadores y la secuencia en el tiempo durante los próximos años, para el desarrollo en materia movilidad urbana sustentable y sostenible, respetuosa con el medio ambiente y energéticamente eficiente para la Zona metropolitana Moroleón - Uriangato - Yuriria.

Desarrollar un análisis de transporte motorizado y no motorizado, infraestructura, políticas y estrategias en materia de la movilidad integral;

Objetivos Específicos :

- Contar con un diagnóstico y pronóstico de movilidad que determinen y midan las necesidades y problemáticas reales y actuales de los municipios en estudio;
- Determinar el modelo de desarrollo integral de movilidad en la zona de estudio, el cual persigue los siguientes principios:
- Contar con los elementos necesarios para determinar las acciones y proyectos que deben realizar los organismos y entidades responsables de la planeación, gestión, organización, operación, mantenimiento, administración y capacitación del sistema de transporte y movilidad urbana.
- Establecer un sistema de evaluación permanente de los proyectos y acciones.



Inicio Contrato	Termino Contrato	Recepción de Anticipo	Inicio por Diferimiento	Term. por Diferimiento
20/01/2016	17/06/2016	03/02/2016	03/02/2016	01/07/2016

Rehabilitación de la Av. Leovino Zavala, Segunda Etapa en Uriangato.


Municipio(s): Uriangato

Origen: FIMETRO 2015

Monto contrato: \$ 11,514,671.93

Descripción General

Pavimentación de los dos cuerpos de la vialidad mediante la construcción de subrasante, base hidráulica y losa de concreto hidráulico de 25 cm de espesor, en un ancho de 10.5 mts c/u, en una longitud de 340 mts, incluye reubicación de drenaje sanitario, pluvial, rehabilitación de red de agua potable y la colocación de señalamiento horizontal y vertical. Con la ampliación de contrato se pavimentaran 200 metros adicionales.

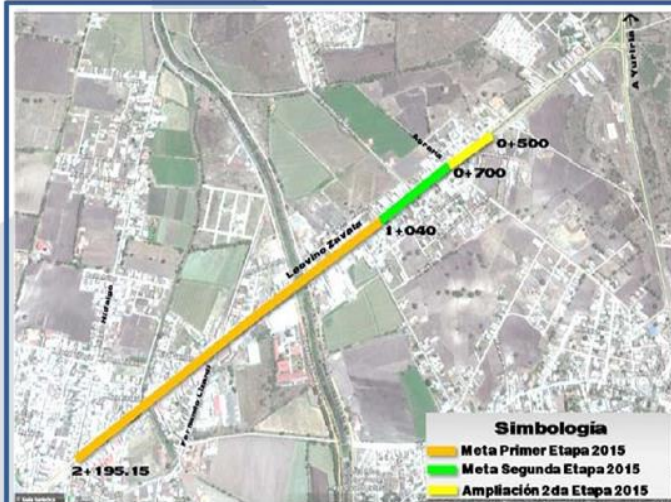

Fechas				
Inicio Contrato	Termino Contrato	Recepción de Anticipo	Inicio por Diferimiento	Term. por Prorroga
31/12/2015	13/05/2016	03/02/2016	04/02/2016	17/06/2016

AVANCE FÍSICO ACUMULADO

REAL
100%
PROGRAMADO
100%

Construcción de Boulevard 5 de Mayo, última etapa en la localidad de Yuriria, Gto

Municipio(s): Yuriria

Origen: FIMETRO 2015

Monto contrato: \$ 7,959,570.86

Descripción General

Construcción de banquetas de 2.88 m de ancho promedio, de concreto hidráulico estampado de 10 cm de espesor en ambos sentidos del boulevard del km 0+420 al 1+920; concreto hidráulico estampado en camellón central; construcción de guarniciones de 10x20x40 del km 0+420 al 1+920; se incluye la reparación de tomas domiciliarias, instalación de alumbrado público del km 0+000 al 1+920 estructurado mediante paneles fotovoltaicos autónomo para operar 2 luminarias en cada punto de luz con poste de 7.5 m, obras complementarias de jardinería, marcas de piso para cruce de peatones, aplicación de pintura en flechas, en estacionamiento y en guarniciones.



AVANCE FÍSICO ACUMULADO

REAL
100%
PROGRAMADO
100%

5TA. SESION ORDINARIA 2016 COMITÉ TÉCNICO FIMETRO MOROLEON-URIANGATO-YURIRIA

SEDESHU/gto

11/11/2016

ZM

