

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS 2015

APASEO
EL GRANDE
COMONFORT
JUVENTINO
ROSAS
VILLAGRAN
CORTAZAR
JARAL DEL TARIMORO
PROGRESO
CELAYA
APASEO
EL ALTO

zona metropolitana
Laja-Bajío

zona metropolitana
Laja-Bajío


ZM

Proyecto Ejecutivo para la ciclovía Celaya - Comonfort, segunda etapa

Municipio(s): Celaya - Comonfort

Origen: FIMETRO 2015

Monto contrato: \$ 914,495.47

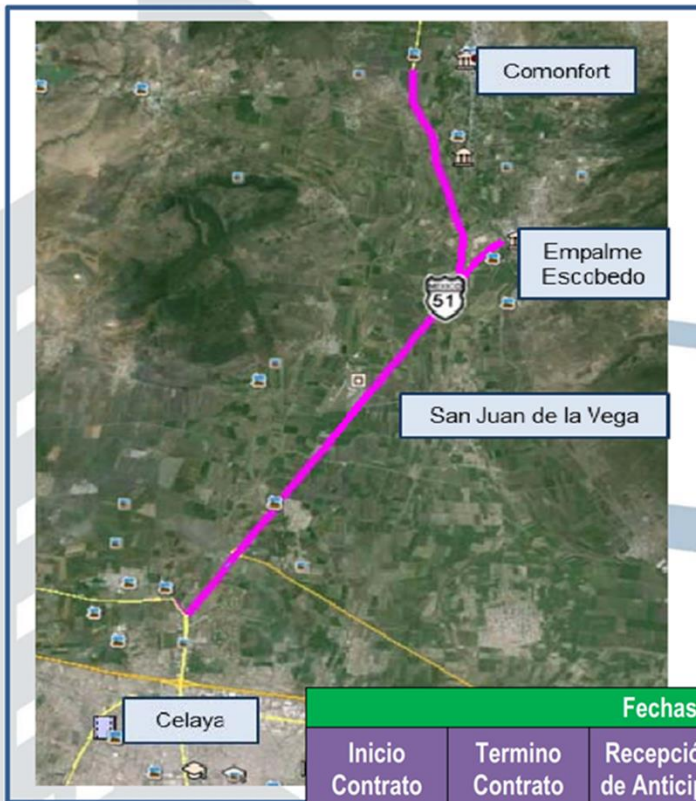

Descripción General

Construcción de ciclovía de un cuerpo de 3.00 m de ancho en ambos sentidos, para una longitud aproximada de 18.7 km. Con una superficie de rodamiento de llancreto de 10 cm de espesor, base de 15 cm y subrasante de 30 cm.

AVANCE FÍSICO ACUMULADO	REAL
	75.0%
	PROGRAMADO
	100.0%

Fechas				
Inicio Contrato	Termino Contrato	Recepción de Anticipo	Inicio por Diferimiento	Term. por Diferimiento
02/01/2016	30/04/2016	03/02/2016	03/02/2016	01/06/2016

Parque Xochipilli 3ra. Sección, Andadores Sur Poniente

Municipio

CELAYA

Datos Generales:

Tipo de Recurso:	FEDERAL
Inversión Asignada:	\$ 9,677,013.30
Inversión Contratada:	\$ 9,837,775.48
Inversión Ampliación:	\$ 160,762.18
Inversión Total Contratada:	\$ 9,837,775.48
Long. Total de Camino	N/A
Meta Inicial:	3,348.75 M2
Meta Ampliada:	320.00 M2
Meta Total:	3,348.75 M2
Contratista:	ARTURO SERNA GAMIÑO
Fecha Inicio Cto:	02 DE ENERO 2016
Fecha Término Cto:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Diferimiento:	NO
Prorroga:	NO
TDPA	N/A
Beneficiarios	362,890 Habitantes
Empleos Directos	
Empleos Indirectos	

Croquis de ubicación:



Período:

DICIEMBRE - JUNIO 2016

Descripción de Trabajos a Realizar:

Las obras que se van a realizar con la inversión del fondo en el ejercicio 2015 consisten en la intervención de 4,848.75 m² para formar 3,348.75 m. de andadores y 1,500 m² de áreas verdes (obra exterior) que ofrecerán la oportunidad de comunicar espacios al interior del parque y permitirán la circulación peatonal propiciando los elementos para la convivencia social, apoyándose mediante el equipamiento fijo que consiste en 27 bancas, 8 botes de basura y 8 juegos infantiles tipo resbaladilla, sube y baja, columpio, etc. y 4 pergolados de herrería que ofrecerán sombra en la zona de bancas, la cual tiene capacidad para 81 personas. Los andadores se iluminan con 16 luminarias, mediante 1,700 m. de instalación eléctrica; se incorporan 1,800 m. de inst. hidrosanitarias y sistema de riego, así como obra exterior, que consiste en 1,500 m² de cubre suelos y unidades arbóreas que formarán áreas verdes confortables para el usuario.

Fotografías:



AVANCE FISICO

REAL

42.25%

AVANCE FINANCIERO

REAL

21.17%



APASEO
EL GRANDE
COMONFORT

JUVENTINO
ROSAS
VILLAGRAN
CORTAZAR
JARAL DEL TARIMORO
PROGRESO



SEDESHU/gto

27/06/2016

ZM
