

## AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS 2015

APASEO  
EL GRANDE  
COMONFORT  
JUVENTINO  
ROSAS  
CELAYA  
VILLAGRAN  
CORTAZAR  
JARAL DEL TARIMORO  
PROGRESO

zona metropolitana  
**Laja-Bajío**

zona metropolitana  
**Laja-Bajío**

# ZM

# Proyecto Ejecutivo para la ciclovía Celaya - Comonfort, segunda etapa

Municipio(s): Celaya - Comonfort

Origen: FIMETRO 2015

Monto contrato: \$ 914,495.47



## Descripción General

Elaboración del proyecto ejecutivo de la ciclovía de un cuerpo de 3.00 m de ancho en ambos sentidos, para una longitud aproximada de 18.7 km. Con una superficie de rodamiento de llancreto de 10 cm de espesor, base de 15 cm y subrasante de 30 cm.

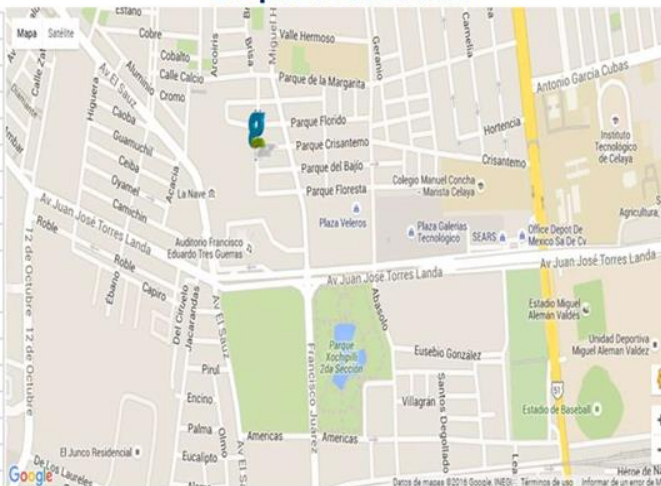
AVANCE FÍSICO ACUMULADO	<b>REAL</b>
	<b>100.0%</b>
	<b>PROGRAMADO</b>
	<b>100.0%</b>

**Acción finiquitada**

Fechas				
Inicio Contrato	Termino Contrato	Recepción de Anticipo	Inicio por Diferimiento	Term. por Diferimiento
02/01/2016	30/04/2016	03/02/2016	03/02/2016	01/06/2016

**Datos Generales:**

<b>Tipo de Recurso:</b>	<b>FEDERAL</b>
<b>Inversión Asignada:</b>	<b>\$ 9,677,013.30</b>
<b>Inversión Contratada:</b>	<b>\$ 9,837,775.48</b>
<b>Inversión Ampliación:</b>	<b>\$ 160,762.18</b>
<b>Inversión Total Contratada:</b>	<b>\$ 9,837,775.48</b>
<b>Long. Total de Camino</b>	<b>N/A</b>
<b>Meta Inicial:</b>	<b>3,348.75 M2</b>
<b>Meta Ampliada:</b>	<b>320.00 M2</b>
<b>Meta Total:</b>	<b>3,348.75 M2</b>
<b>Contratista:</b>	<b>ARTURO SERNA GAMIÑO</b>
<b>Fecha Inicio Cto:</b>	<b>02 DE ENERO 2016</b>
<b>Fecha Término Cto:</b>	<b>30 DE SEPTIEMBRE DE 2016</b>
<b>Diferimiento:</b>	<b>NO</b>
<b>Prorroga:</b>	<b>NO</b>
<b>TDPA</b>	<b>N/A</b>
<b>Beneficiarios</b>	<b>362,890 Habitantes</b>
<b>Empleos Directos</b>	
<b>Empleos Indirectos</b>	

**Croquis de ubicación:**

**Período:**
**DICIEMBRE 2015 - AGOSTO 2016**
**Descripción de Trabajos a Realizar:**

Las obras que se van a realizar con la inversión del fondo en el ejercicio 2015 consisten en la intervención de 4,848.75 m<sup>2</sup> para formar 3,348.75 m. de andadores y 1,500 m<sup>2</sup> de áreas verdes (obra exterior) que ofrecerán la oportunidad de comunicar espacios al interior del parque y permitirán la circulación peatonal propiciando los elementos para la convivencia social, apoyándose mediante el equipamiento fijo que consiste en 27 bancas, 8 botes de basura y 8 juegos infantiles tipo resbaladilla, sube y baja, columpio, etc. y 4 pergolados de herrería que ofrecerán sombra en la zona de bancas, la cual tiene capacidad para 81 personas. Los andadores se iluminan con 16 luminarias, mediante 1,700 m. de instalación eléctrica; se incorporan 1,800 m. de inst. hidrosanitarias y sistema de riego, así como obra exterior, que consiste en 1,500 m<sup>2</sup> de cubre suelos y unidades arbóreas que formarán áreas verdes confortables para el usuario.

**Fotografías:**

**AVANCE FISICO**
**REAL**
**75.15%**
**AVANCE FINANCIERO**
**REAL**
**50.67%**



APASEO  
EL GRANDE  
COMONFORT



JUVENTINO  
ROSAS  
CELAYA  
VILLAGRAN  
APASEO  
EL ALTO  
CORTAZAR  
JARAL DEL TARIMORO  
PROGRESO



**SEDESHU/gto**

28/08/2016

**ZM**
